

INFORME DE SIMAPA Octubre 2021 a Junio 2022

Obras: Extracción de bomba Pozo # 3 Ajijic.

Descripción: La extracción de bomba Pozo # 3 en Ajijic de 120 mts. de columna.

- Reparación de motor y se acopla bomba nueva marca BAMSA modelo 132130/4 en acero inoxidable de fundición para 30 hp, esto para modificar el funcionamiento del equipo, prevenir daños.
- Se retira camisa de bomba ya que también se encontraba perforada.
- Arrancador.

Inversión: \$148,431.63 (Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 63/100 M.N.).

Beneficiarios: 6,000 personas.

Ubicación: Guadalupe Victoria # 63.



Fotografías:



Obras: Extracción de bomba pozo # 3 en Chapala, 05 de Noviembre de 2021.

Descripción:

- Se hace toma de video a pozo encontrando la perforación con riesgos de colapso así como azolve según los datos de perforación original.
- Debido al daño detectado en la perforación se realiza intento de desazolve y cepillado de pozo para posteriormente realizar el sobre ademe y garantizar la estructura del pozo.
- Se instalan 131 m de ademe en 10" que es la perforación libre disponible. Se Reequipa con un modelo de bomba para menor flujo.
- Se instala equipo marca Altamira modelo kor20r500-12 con motor serie x de 50hp.
- Al arranque presenta aportación de arena y abatimiento por lo cual se estrangula el flujo para estabilizar el equipo.
- Reinstalación de un equipo de mejor flujo mientras que se realiza la reposición del pozo.
- Instalando bomba Kor6r200 con motor de 20 hp serie x y cable nuevo calibre 3x4.
- Se instala ese equipo para abastecer en las medidas de las posibilidades Barrio nuevo, las redes, barrio de Guadalupe, barrio del sobaco mientras se realiza la reperfuración aún costado del pozo y complementando con pipas de agua en los domicilios.

Inversión: \$3'856,603.00 (Tres millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos tres pesos 00/100 M.N.).

Beneficiarios: 8,000 personas.

Ubicación: Pedro Moreno # 67.



Fotografías:



Obras: Extracción de bomba Pozo # 7 en San Antonio. 08 de Noviembre de 2021.

Descripción:

- Cuerpo de bomba dañado al igual que el motor por abatimiento del pozo.
- Se instala bomba Kor20r500-12 con motor sumergible suditra.

Inversión: \$351,772.57 (Trescientos cincuenta y un mil setecientos setenta y dos pesos 57/100 M.N.).

Beneficiarios: 3,000 personas.

Ubicación: Priv. San Jorge 500.



Fotografías:



Obras: Instalación de bomba en Pozo Tobolandia en Ajijic, 11 de Noviembre de 2021.

Descripción:

- Se instala bomba Bamsa 141134/4 con motor Altamira de 75 hp reparado.
- Se utiliza cable sumergible nuevo proporcionado por el sistema.

Inversión: \$106,807.81 (Ciento y seis mil ochocientos siete pesos 81/100 M.N.).

Beneficiarios: 8,000 personas.

Ubicación: Carretera Chapala-Jocotepec s/n.



Fotografías:



Obras: Extracción de bomba Pozo # 4 en Chapala, 02 de Diciembre de 2021.


Descripción:

- Se instala motor sumergible nuevo de 15 hp serie x acoplado a bomba reparada Kor6r150-12.


Inversión: \$53,472.00 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Beneficiarios: 3,000 personas.

Ubicación: Álvaro Obregón # 100.



Fotografías:

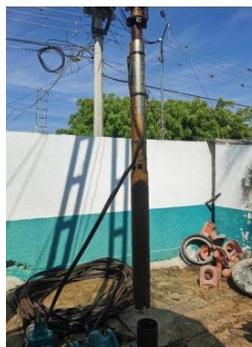

Obras: Extracción de bomba Pozo La Cascada en Chapala, 22 de Diciembre de 2021.

Descripción:

- Cable sumergible calibre 3x2/0 nuevo.

Inversión: \$243,890.00 (Doscientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.).

Beneficiarios: 6,000 personas.

Ubicación: Cascada # 14.

Fotografías:



Obras: Instalación de equipo de aforo en Pozo San Vicente en Ajjic, 26 de Enero de 2022.

Descripción:

- Logrando instalar 180 mts. de columna debido a un atorón en el pozo.
- Presenta mucha aportación de lodo y bentonita así como residuos de la perforación. Posteriormente haciéndole un servicio de lavado para instalar el siguiente equipo: bomba sumergible marca Altamira Kor15r600-18, motor sumergible marca Altamira Kor15r600-18, variador de frecuencia ensamblado en gabinete para 60 hp marca Invt.
- 16 de Mayo del 2022. Se instala bomba modelo Kor15r600-18 acoplada a motor marca Franklin de 60 hp en 6". 2 Válvulas check de columna y su tren de descarga con medidor de flujo y juego de válvulas.

Inversión: \$1'389,482.23.

Beneficiarios: 2,000 personas.

Ubicación: Priv. San Vicente # 1000 int 90.

Fotografías:



Obras: Extracción de bomba en Pozo # 4 en Ajjic, 11 de Febrero del 2022.

Descripción:

- Se realiza servicio de limpieza a pozo desazolve y cepillado ligero para posteriormente colocar camisas en las partes dañadas.
- Se colocan 2 camisas para tapar las partes dañadas a 127 mts continuas.
- Se instala bomba nueva Marc Suditra para 125 hp acoplado a mismo motor.

Inversión: \$892,434.00 (Ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Beneficiarios: 8,000 personas.

Ubicación: Rio Yaki # 140. Villanova.



Fotografías:



Obras: Extracción de bomba Pozo # 9 en Chapala, 11 de Febrero del 2022.


Descripción:

- Se instala bomba de mayor capacidad y se realiza aumento de columna llegando a 170 mts en 6" y 5", bomba Kor25r750-10-1b con motor serie x de 75 hp.

Inversión: \$232,856.00 (Doscientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).

Beneficiarios: 7,000 personas.

Ubicación: Zaragoza # 1418.



Fotografías:

